

Tilsynsrapport

Sagsnr.: 13.02.01-K08-2-23 Sagsnavn: Søhus Vandværk – Tilsyn med vandindvindingsanlæg I tilsynet deltog: Aksel Snerling, Søhus Vandværk Martin Køster, Søhus Vandværk	Kommune: Odense Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Rikke Sparsø Pedersen E-mail: rispe@odense.dk Telefon: 2153 1947	Dato: 22-10-2025 Dato for sidste tilsyn: 15-09-2023 Ordinært tilsyn: X Opfølgende tilsyn:
---	---	--

Stamdata	
Vandforsyningens navn	Søhus Vandværk
Vandforsyningens CVR / P nummer:	28211716
Anlæggets navn	Søhus Vandværk
Adresse	Slettensvej 174, 5270 Odense N
Kontaktperson	Aksel Snerling
Formand for anlægget/forsyningschef	Aksel Snerling
Tlf. nummer til formand / kontaktperson	4033 8018
Jupiter ID	82037
Indvindingstilladelse (m ³ /år, udløbsdato)	160.000 m ³ (30-04-2040)
Indvinding seneste år (2022)	114.249 m ³
Antal kunder, opgjort efter antal målere:	Ca. 1.740 forbrugere
Prøvetagningssteder for vandkvalitetsmåling på ledningsnettet (se § 13 i bekendtgørelsen)	Groløkkevænget 73 Anderupvænget 49 Pomosavej 17 Tingskiftet 60

Status over fund af DMS pr. 21-10-2025	
Boring DGU nr. 136.330, 136.146, 136.986, 136.566 (boringerne er ikke i drift)	Fund af DMS gennem mange år
DGU nr. 136.1804 (i drift)	Ingen fund af DMS
DGU nr. 136.2697 (i drift)	Fund af DMS: 2019: 0,019 ug/l 2020: 0,026 ug/l 2024: 0,017 ug/l 2025: 0,024 ug/l

Status BNBO pr. 15-09-2023	
Boring DGU nr. 136.1804 + 136.2697	Tinglyst dyrkningsaftale i relevante dele af BNBO

Baggrundsdata			
Grænseværdier for mikrobiologiske eller kemiske parametre for vandkvaliteten på drikkevandet er overholdt:	Ja: X	Nej:	
Ledelsessystemer/kvalitetssikringssystem	Ja: X	Nej:	DDS, Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed. Ledelseshåndbog er i brug.
Er lovpligtigt kontrolprogram gennemført og er det fulgt?	Ja: X	Nej:	
Foreligger egen tilstandsrapport	Ja:	Nej: X	15-09-2023: Anlæggets og bygningens tilstand vurderes løbende, jf. overvågningen via ledelsessystemet DDS.
Foreligger tilstandsrapport fra eksterne rådgivere:	Ja:	Nej: X	Højfeldt og rapport fra Energi Fyn på el-delen
Foreligger vedligeholdelsesplan: (Vedligeholdelsesplanen bør omfatte: boringer, råvandsledninger, produktionsbygning, rentvandsbeholder, udpumpningsanlæg og ledningsnet)	Ja: X	Nej:	Vedligehold af anlægget, bygningen, ledninger og boringer følger det automatiske vedligeholdelsesprogram, der genereres via DDS-ledelsessystemet.
Har vandforsyningen en beredskabsplan:	Ja: X	Nej:	Der foreligger beredskabsplan, telefonlister og handleplan. Forefindes digitalt og som papirudgave på vandværket. Søhus Vandværk vil opdatere beredskabsplanen og telefonlister.
Kan vandforsyningsanlægget nødforsynes med vand:	Ja: X	Nej:	Fra Næsby vandværk, Tarup Vandværk og Vandcenter Syd
Kan vandforsyningsanlægget nødforsynes med strøm	Ja: X	Nej:	Anlægget har en generator tilknyttet. Der er diesel i dunke, som rækker til en lille uges drift. Tænder automatisk ved behov. Testes en gang i kvartalet.
Er den kommunale indsatsplan fulgt:	Ja: X	Nej:	<i>Evt. bemærkninger</i>
Overholder anlægget underretningsforpligtelserne til kommunalbestyrelsen: (indvinding, pejlinger, boringsanvendelse)	Ja: X	Nej:	
Forbrugerinformation: Analyseresultater lægges løbende på hjemmesiden.			
Andet: Solceller (7 KW) er monteret på tag i 2012 + supplerende i 2015. Dækker ca. 10 % af elforbruget på værket			

Produktion					
VANDVÆRKSBYGNINGEN					
Aflåst:	Ja: X	Nej	God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Indhegnet:	Ja: X	Nej	God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Alarmsikret mod hærværk / terror:	Ja: X	Nej	God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Sikring af vandforsyningen: Aflåsning af låge i hegn, dør til vandværksbygningen og alle dæksler til borer. Alarm ved indtrængen i borer, på vandværk og ved indtrængning i overbygning på rentvandsbeholder (ved åbning af dør til dæksler). 6 overvågningskameraer i og ved vandværket. Nøglesystemet til både vandværk og borer er i 2025 blevet udskiftet til et elektronisk låsesystem, iLOQ-system.					
Luftindtag og ventilation beskyttet:	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Bemærkninger: Tilgangsluft til værket filtreres med posefilter og hepafilter, og der opretholdes overtryk i bygningen – etableret i 2014. Vandværker sørger selv for vedligehold, rensning og udskiftning af filter.					
Rentvandspumper Antal: 4 stk. Alder: 1 stor reservepumpe	God: X		Acceptabel:		Dårlig:
 					
22-10-2025					
Interne pumper Antal: Alder:	Ja:	Nej:			
Hydrofor Antal:	Ja:	Nej: X	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Størrelse på Hydrofor:					
Placering / mærkning af prøvetagningshaner	God: X		Acceptabel:		Dårlig:
Hjælpemaskiner fx kompressor	Nej				
Vandmåler råvand Er måler i overensstemmelse med tilladelse	Ja: X	Nej:	God: X Måler pr. boring ved indgang til vandværk	Acceptabel:	Dårlig:
Vandmåler skyllevand Er måler i overensstemmelse med tilladelse	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Vandmåler afgang Er måler i overensstemmelse med tilladelse	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel:	Dårlig:

SRO-anlæg	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Affugtningsanlæg: Kondensaffugter	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Andre instrumenter, fx onlinemåling mv.:	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Tilbagefølsventiler og styreorganer	God: X I rentvandstank		Acceptabel:		Dårlig:
Afløbsforhold: 1 afløb i vandværksbygning. Pumpes til slambassin	God: X		Acceptabel:		Dårlig:
Sikring mod optrængning af kloakvand	God: X		Acceptabel:		Dårlig:
Sikring mod indtrængning af regnvand	God: X		Acceptabel:		Dårlig:
Synlige rør	God: X		Acceptabel:		Dårlig:
Udv. vedligeholdelse af bygning	God: X		Acceptabel:		Dårlig:
Indv. vedligeholdelse af bygning	God: X		Acceptabel:		Dårlig:
Bemærkninger:					

ILTNING / FILTERANLÆG					
Luftindtag og ventilation beskyttet	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel :	Dårlig:
<u>Type Iltningsanlæg</u> 2 beluftningstårne. Faskiner monteret inde i beluftningstærnene (mikro-drop iltning) – jern, mangan og kalk udfældes. Faskinerne har i 2025 fået udskiftet plastkassetterne.					
<u>Type filteranlæg</u> 4 parallelle forfiltre - 2 til hvert beluftningstærn 8 parallelle efterfiltre Renoveret i 2021 og 2022 med nyt filtermateriale (sandfiltre), nye dyser og ny filterbund (halvdel af filter udskiftet i 2021 og anden halvdel udskiftet i 2022).					



22-10-2025, beluftningstårn



22-10-2025, efterfilter

Iltningsanlæg	God: X		Acceptabel	Dårlig	
Iltningsaggregater* :	Ja:	Nej: X	God:	Acceptabel :	Dårlig:
Reaktionsbassin:	Ja:	Nej: X	God:	Acceptabel :	Dårlig:
Åbne filteranlæg:	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel :	Dårlig:
Trykfilteranlæg:	Ja:	Nej: X	God:	Acceptabel :	Dårlig:
Er der etableret rottespærre	Ja: X ved toiletter		Nej:		

Anden vandbehandling:

UV-anlæg (forebyggende vandbehandling, fremskudt barriere). Etableret 2021.
Vandets kvalitet skal overholde alle kravværdier inden det ledes til UV-anlægget.

Bemærkninger:

Turbiditet måles løbende.

*Iltningsaggregat: produktion af ren ilt

RENTVANDSBEHOLDER					
Rentvandsbeholder:	Ja: X	Nej:			
Beliggenhed over terræn:	Ja:	Nej: X			
Volumen (m³): 2 parallelle beholdere på i alt 413 m³. Kan aflukkes hver for sig. Beholderne er lukket med dobbeltlåg. Inspiceres hvert 5. år - senest i 2024. Inspiceret af Højfjeldt.					
Alarm for høj vandstand	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Alarm for lav vandstand	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Overløbsrør beskyttet	Ja:	Nej: X Der er ikke overløbsrør	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Er der prøveudtagningshænder	Ja:	Nej: X	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Indhegnet	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Renholdt og ryddeligt	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Tætliggende beplantning og/eller træerødder	Ja:	Nej: X	God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Udvendig vedligeholdelse	God: X		Acceptabel:		Dårlig:
Indvendig vedligeholdelse	God: X		Acceptabel:		Dårlig:
Dato for seneste indvendige inspektion: 12. marts 2024 - tankene blev tømt og inspiceret. <i>Odense Kommune vil gerne have tilsendt en kopi af servicereporten.</i>					
Beholderinspektion udført af (firma): Højfjeldt					
Fri for utætheder (synlige) Kunne ikke tilses ved tilsyn.	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Aflåst låge eller lem	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Tætsluttende låg	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Ventilationsåbning beskyttet	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Er der på vandværket mulighed for at brandbiler kan hente vand	Ja:		Nej: X		Type:
Bemærkninger: Dækslerne til rentvandsbeholderne blev ikke åbnet for kommunens tilsyn d. 15-09-2023. Dækslerne til rentvandsbeholderne blev ikke åbnet for kommunens tilsyn d. 22-10-2025. Overbygning af rentvandsbeholderne er foretaget i 2012, så regnvand ikke kan ramme dækket.					

SKYLLEVAND

Som udgangspunkt følges nedenstående skyllefrekvenser eller filtre skylles, hvis vandstanden begynder at blive for høj.

Oplyst ved tilsyn d. 15-09-2023 og d. 22-10-2025:

Filtre skylles, når følgende mængder er løbet igennem filteret:

Filter 1: forfilter 750 m³ og efterfilter 1.200 m³

Filter 2: forfilter 1.100 m³ og efterfilter 14.000 m³

Filtrene skylles i 5 min. Der skylles med 60 m³/min.

Skylning med rent vand (X) råvand ()

Bundfældningsbassin Størrelse: Ca. 24 m ³	Ja: X	Nej:	Henstand i timer: Ca. 24 timer		
Indhegnet	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Aflåst låge	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Renholdt og ryddeligt	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Udledning af skyllevand	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Genbrug af skyllevand	Ja:	Nej: X	God:	Acceptabel:	Dårlig:

Tilladelse fra 1993 til udledning af filterskyllevand til offentligt rørlagt vandløb, Lumbyafløbet.

Vilkår i tilladelsen:

- Bundfældningsbassin: hydraulisk opholdstid mindst 16 timer
- Må ikke etableres nødoverløb
- Tømmes mindst 1 gang pr. år eller ved slamtykkelse på 0,1 meter (10 cm)
- Til kontrolleret losseplads

Oplyst ved tilsyn 15-09-2023:

Hydraulisk opholdstid i bundfældningsbassin er ca. 1 døgn.

Oplysninger om slutdisponering af slam, herunder okkerslam:

Til kontrolleret losseplads. 1,5 tons/år → halvering af mængden ved indvindingsstyring.

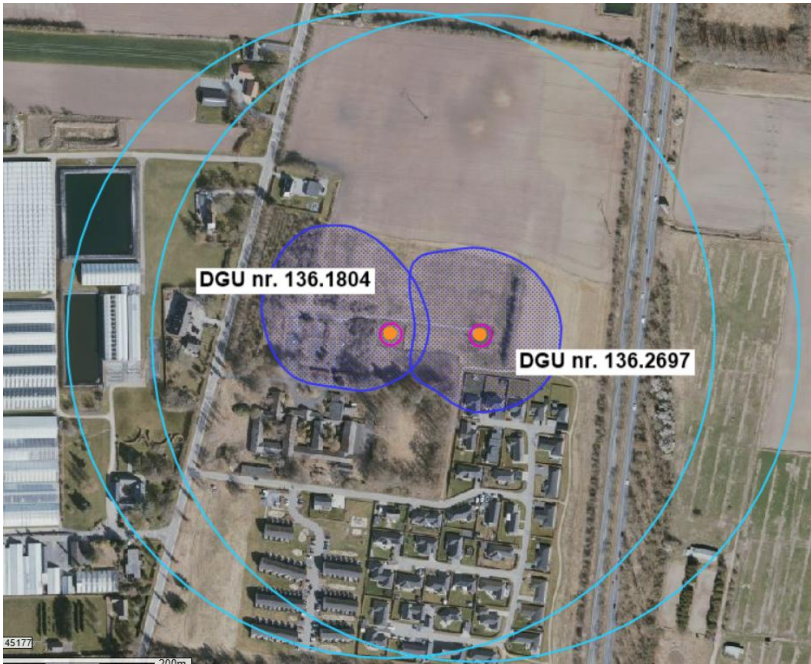
Oplyst 15-09-2023: Vandværk har ikke kendskab til, hvilket modtageanlæg, der benyttes. Transportøren, der henter slammet, ved dette.

Oplyst 22-10-2025. Vandværket har ikke kendskab til, hvilket modtageanlæg, der benyttes. Transportør ikke oplyst.

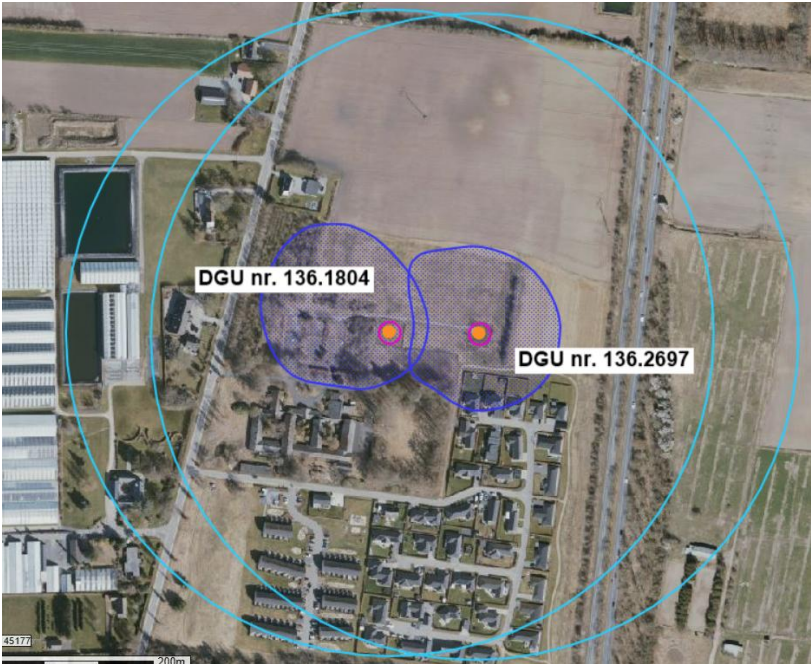
Bemærkninger:

Distribution – LEDNINGSNET					
Karakter af tegningsmateriale (f.eks. digitalt): Foreligger digitalt og på kort					
RENTVANDSLEDNINGER (forsyningsnettet):					
Samlet længde: 38,8 km med ca.					
Sektionering: Ja, har sektionsmålere. 6 styk.					
Materiale: PVC					
Årligt tab på ledningsnet (%): < 2 % p.t.					
I 2023 var der på et tidspunkt et spild på ca. 10 % pga. lækager 7 steder på ledningsnettet. Blev udbedret.					
Natforbrug (m³/time): ca. 5 m³					
Er der etableret sikring mod tilbageløb hos relevante virksomheder m.fl.					
Er der brandhaner på ledningsnettet: Der er 37 brandhaner på ledningsnettet					
Bemærkninger:					
Trykforøgningssektion:		Ja:		Nej: X	
Trykreduktionssektion:		Ja:		Nej: X	
Brønde på ledningsnettet:	Ja:	Nej: X	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Udluftningsbrønde:	Ja:	Nej: X	God:	Acceptabel:	Dårlig:

Oversigt over tilsyn med boringer			
Udfyldte tilsynsskemaer for de besigtigede boringer ses under skemaet			
Boringer DGU-nr.	Tilsyn d. 22-10-2025	Sidste tilsyn	
136.1804	Ja	15-09-2023	I drift
136.2697	Ja	15-09-2023	I drift
136.0330	Nej	15-09-2023	På vandværksgrunden Reserve/nødvand Kontrolprogram følges ikke, der udtages løbende DMS-prøver hen over året.
136.0146	Nej	15-09-2023	På vandværksgrunden Reserve/nødvand Kontrolprogram følges ikke, der udtages løbende DMS-prøver hen over året.
136.0986	Nej	17-10-2019	Ligger på mark ud for Larsskovgyden nr. 24. Monitering/kontrol Kontrolprogram følges ikke, der udtages løbende DMS-prøver hen over året. Boring fra 1999. <i>Overvej tilsyn af boring ved næste vandværkstilsyn.</i>
136.0566	Nej	17-11-2021	Ligger på græsplæne, Anderuplunden ud for nr. 89 Reserve/nødvand Kontrolprogram følges ikke, der udtages løbende DMS-prøver hen over året. Boring fra 1979. <i>Overvej tilsyn af boring ved næste vandværkstilsyn.</i>
Bemærkning: Hvis reserve/nød boringerne eller monitering/kontrol boringen inddrages i driften igen, skal kommunen orienteres bl.a. med henblik på tilsyn. Oplyst d. 22-10-2025: VandCenter Syd har udført TV-inspektion af boringerne. <i>Kommunen vil gerne have oplyst, hvornår, der er udført TV-inspektion.</i>			

INDVINDING					
BORING DGU NR.: 136.2697 Dybde: 51 m Ydeevne: 30 m ³ /time Etableret: 2019		Dato for sidste tilsyn: 15-09-2023 Dato for dette tilsyn: 22-10-2025			
					
		22-10-2025: Fredningsbælter, BNBO og 300 m beskyttelseszoner			
					
15-09-2023		22-10-2025			
Fredningsbælte: Ja, græsareal der slås					
Angiv størrelse på fredningsbælte (radius): 10 meter Hæk plantet til afgrænsning af arealet.					
Indhegning/afgrænsning:	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Renholdt og ryddeligt:	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel:	Dårlig:

Er 10 m bælte udlagt og afgrænset:	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt:	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde:	Ja: X	Nej:	Størrelse: Ca. 17.500 m ²		
Bemærkninger: Tinglyst dyrkningsaftale fra 2021 i relevant del af BNBO					
BORINGENS PLACERING (Sæt kryds): Tørbrønd () / Overbygning (X) / Hus () i vandværks bygning ()					
Boringsrørafslutning:		Under terræn:		Over terræn: X	
Aflåst dæksel eller lem:	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Alarmsikring mod hærværk / terror:	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Ventilation af tørbrønden:	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Tæt bund, sider og dæksel:	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Er brønden tør?:	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Vandtæt forerørsforsegling	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Tætte rørgennemføringer	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Råvandspumpes ydeevne: 30 m ³ /time og strømforbrug	God:			Acceptabel:	Dårlig:
Terrænfald fra bygværk:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel: X	Dårlig:
Renholdt og ryddeligt:	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Bemærkninger:					
BORING / BRØND					
Mærkning af boring (DGU nr.):	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Pejlemulighed:	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Angivelse af pejlepunkt: Pejlerør, der korrigeres manuelt til terræn					
Prøvetagningsshane:	Ja:	Nej: X	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Udluftningsstuds afsluttet over terræn:	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Udluftning nedadvendt m. insektnet:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Bemærkninger: Prøvetagningsshane er placeret på vandværket og ikke ved boringen.					
RÅVANDSLEDNINGER Ikke adspurg					
Samlet længde:					
Alder på indpumpninganlæg:					
Materiale:					
Bemærkninger:					

INDVINDING					
BORING DGU NR.: 136.1804 Dybde: 49 m Ydeevne: 47,11 m ³ /time Etableret: 2016		Dato for sidste tilsyn: 15-09-2023 Dato for dette tilsyn: 22-10-2025			
					
		22-10-2025: Fredningsbælter, BNBO og 300 m beskyttelseszoner			
		 			
22-10-2025		22-10-2025			
Fredningsbælte: Ja, græsareal der slås					
Angiv størrelse på fredningsbælte (radius): 10 meter					
Hæk plantet til afgrænsning af arealet.					
Indhegning/afgrænsning:	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Renholdt og ryddeligt:	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel:	Dårlig:

Er 10 m bælte udlagt og afgrænset:	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt:	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde	Ja: X		Nej:		Størrelse: Ca. 18.500 m ²
Bemærkninger: Tinglyst dyrkningsaftale fra 2021 i relevant del af BNBO					
BORINGENS PLACERING (Sæt kryds): Tørbrønd () / Overbygning (X) / Hus () i vandværks bygning ()					
Boringsrørafslutning:		Under terræn:		Over terræn: X	
Aflåst dæksel eller lem:	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Alarmsikring mod hærværk / terror:	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Ventilation af tørbrønden:	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Tæt bund, sider og dæksel:	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Er brønden tør?:	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Vandtæt forerørsforsegling	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Tætte rørgennemføringer	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Råvandspumpes ydeevne: 20 m ³ /tm og strømforbrug	God:		Acceptabel:		Dårlig:
Terrænfald fra bygværk:	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel: X	Dårlig:
Renholdt og ryddeligt:	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Bemærkninger:					
BORING / BRØND					
Mærkning af boring (DGU nr.):	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Pejlemulighed:	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Angivelse af pejlepunkt: Pejlerør, der manuelt korrigeres til terræn					
Prøvetagningshane:	Ja:	Nej: X	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Udluftningsstuds afsluttet over terræn:	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Udluftning nedadvendt m. insektnet:	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Bemærkninger: Prøvetagningshane er placeret på vandværket og ikke ved boringen.					
RÅVANDSLEDNINGER <i>Ikke adspurg</i>					
Samlet længde:					
Alder på indpumpninganlæg: samme alder som boring (2016)					
Materiale:					
Bemærkninger:					

INDVINDING					
BORING DGU NR.: 136.146 Ikke i drift, reserve Ved vandværket Dybde: 34,7 m Ydeevne: 17 m ³ /time Etableret: 1964		Dato for sidste tilsyn: 17-11-2021 Dato for dette tilsyn: 15-09-2023			
Fredningsbælte: Ligger på vandværksgrunden på Slettensvej 174					
Angiv størrelse på fredningsbælte (radius): 5 meter					
Indhegning/afgrænsning:	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Renholdt og ryddeligt:	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Er 10 m bælte udlagt og afgrænset: <i>Ligger på vandværks-grunden, 5 meter bælte</i>	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt:	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO):	Ja: X	Nej:	Størrelse: Ca. 28.800 m ²		
Bemærkninger:					
BORINGENS PLACERING (Sæt kryds): Tørbrønd () / Overbygning (X) / Hus () i vandværks bygning ()					
Boringsrørslutning:	Under terræn:		Over terræn: X		
Aflåst dæksel eller lem:	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Alarmsikring mod hærværk / terror:	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Ventilation af tørbrønden:	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Tæt bund, sider og dæksel:	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Er brønden tør?:	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Vandtæt forerørsforsegling	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Tætte rørgennemføringer	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Råvandspumpes ydeevne: 15,2 m ³ /tm og strømforbrug	God:			Acceptabel:	Dårlig:
Terrænfald fra bygværk:	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel: X	Dårlig:

Renholdt og ryddeligt:	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel :	Dårlig:
Bemærkninger:					
BORING / BRØND					
Mærkning af boring (DGU nr.):	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel :	Dårlig:
Pejlemulighed:	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel :	Dårlig:
Angivelse af pejlepunkt:					
Prøvetagningshane:	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel :	Dårlig:
Udluftningsstuds afsluttet over terræn:	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel :	Dårlig:
Udluftning nedadvendt m. insektnet:	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel :	Dårlig:
Bemærkninger:					
RÅVANDSLEDNINGER <i>Ikke adspurg</i>					
Samlet længde:					
Alder på indpumpninganlæg:					
Materiale:					
Bemærkninger:					

INDVINDING					
BORING DGU NR.: 136.330 Ikke i drift, reserve Ved vandværket Dybde: 34 m Ydeevne: 27,6 m/time Etableret: 1973			Dato for sidste tilsyn: 17-11-2021 Dato for dette tilsyn: 15-09-2023		
Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale) Ligger på vandværksgrunden på Slettensvej 174					
Angiv størrelse på fredningsbælte (radius): 5 meter					
Indhegning/afgrænsning:	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Renholdt og ryddeligt:	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Er 10 m bælte udlagt og afgrænset: <i>Ligger på vandværks-grunden, 5 meter bælte</i>	Ja: X	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt:	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO):	Ja: X		Nej:	Størrelse: Ca. 28.800 m2	
Bemærkninger:					
BORINGENS PLACERING (Sæt kryds): Tørbrønd () / Overbygning (X) / Hus () i vandværks bygning ()					
Boringsrørslutning:	Under terræn:		Over terræn: X		
Aflåst dæksel eller lem:	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Alarmsikring mod hærværk / terror:	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Ventilation af tørbrønden:	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Tæt bund, sider og dæksel:	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Er brønden tør?:	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Vandtæt forerørsforsegling	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Tætte rørgennemføringer	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Råvandspumpes ydeevne: 16,6 m3 og strømforbrug	God:			Acceptabel:	Dårlig:
Terrænfald fra bygværk:	Ja:	Nej:	God: X	Acceptabel:	Dårlig:
Renholdt og ryddeligt:	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel:	Dårlig:

Bemærkninger:					
BORING / BRØND					
Mærkning af boring (DGU nr.):	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel :	Dårlig:
Pejlemulighed:	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel :	Dårlig:
Angivelse af pejlepunkt:					
Prøvetagningshane:	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel :	Dårlig:
Udluftningsstuds afsluttet over terræn:	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel :	Dårlig:
Udluftning nedadvendt m. insektnet:	Ja: X	Nej:	God: X	Acceptabel :	Dårlig:
Bemærkninger:					
RÅVANDSLEDNINGER <i>Ikke adspurg</i>					
Samlet længde:					
Alder på indpumpning anlæg:					
Materiale:					
Bemærkninger:					
